




Schleswig-Holstein
Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit, Verkehr und
Technologie

A 20, Nord-West-Umfahrung Hamburg

Streckenabschnitte: Planungsstand

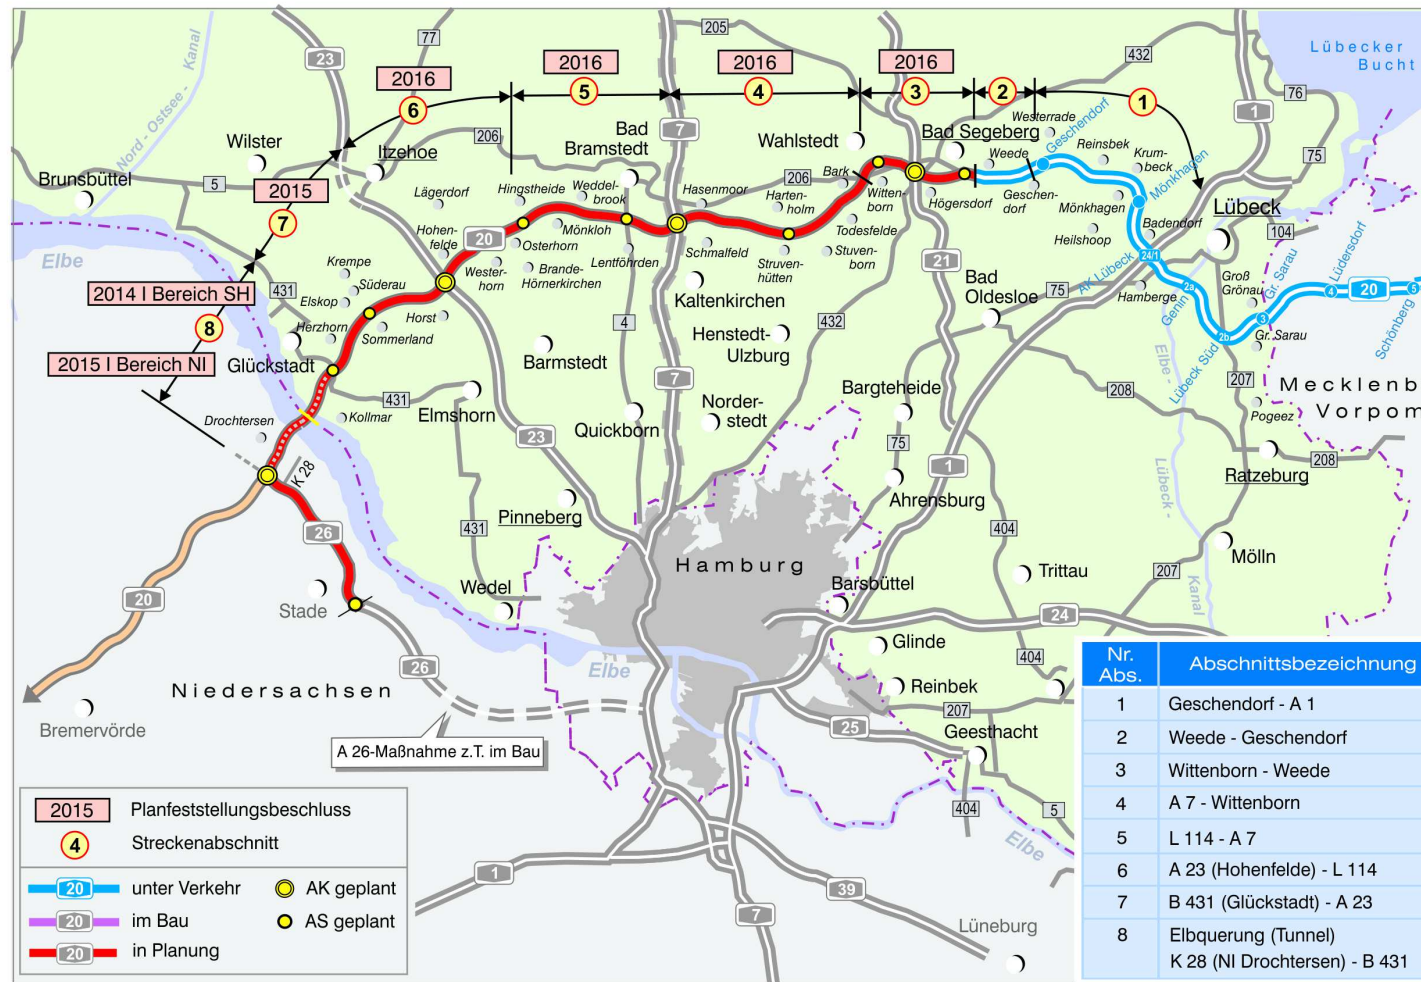

1 - unter Verkehr: 28. Juli 2009
- Kosten: ca. 102,7 Mio. EUR / Länge: 15,7 km

2 - unter Verkehr: 21. Dezember 2009
- Kosten: rd. 44,6 Mio. EUR / Länge: 6,25 km

3 - Planfeststellungsbeschluss liegt vor
(seit: 30. April 2012)
- Aufgrund des BVerwG-Urteils vom 6.11.2013
ist der Beschluss nicht vollziehbar.
- Planfeststellungsergänzungsverfahren
in der Vorbereitung

4 - im Planfeststellungsverfahren (Juli 2009)
- Planfeststellungsbeschluss: 2016

5 - im Planfeststellungsverfahren (Okt. 2010)
- Planfeststellungsbeschluss: 2016

6 - im Planfeststellungsverfahren (Mai 2008)
- Planfeststellungsbeschluss: 2016

7 - im Planfeststellungsverfahren (Dez. 2007)
- Planfeststellungsbeschluss: 2015

8 - Planfeststellungsbeschluss für SH liegt vor
(seit: 30. Dezember 2014)

Baubeginn: 3. Abschnitt
Abhängig von der Rechtskraft des Planfeststellungs-
ergänzungsbeschlusses

Baubeginn: 4. Abschnitt
Abhängig von der Rechtskraft des Planfeststellungs-
beschlusses und Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel
durch den Bund als Baulastträger der A 20

Baubeginn: 5. bis 8. Abschnitt
nach 2017

Grafik: Manuela Renk - VII 413

Referat 41 / Stand: Februar 2015
